

INFORME INSPECCIÓN VISUAL

AWS D1.1 2020

Cliente:	Concreacero	Rep N°:	T3135I0014
Proyecto:	Puente Metro - Madera	Fecha:	22-oct-24
Subproyecto:	Estructura Metalica - Conjunto C1 - Fase 4	Lugar:	Copacabana
Contratista:	N.A.		
Elaboró:	Ing. Jorge Uribe.		
Proceso de soldadura:	GMAW	Tipo:	Semi-Automático

1. NORMAS PARA EL CRITERIO DE EVALUACIÓN:

AWS D1.1 2020

2. EQUIPOS UTILIZADOS

Flexómetro, Calibrador, galga soldadura, Cámara digital, linterna

3. MATERIAL BASE:

ASTM A500 Gr C

4. ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE SOLDADURA

OBSERVACIONES

Chequear la calificación del personal	F.A.		
Chequear el tipo del material base y el de aporte	F.A.		
Chequear si hay algún tipo discontinuidad en el metal base	F.A.		
Chequear el alineamiento de la junta de soldadura	F.A.		
Chequear condiciones de precalentamiento	F.A.		

5. INICIO DE LA JUNTA

OBSERVACIONES

Angulo de chaflán	F.A.		
Hombro de raíz	F.A.		
Alineamiento de la junta	F.A.		
Respaldo con soldadura o platina	F.A.		
Limpieza de la junta	F.A.		
Puntos de soldadura (si se punteo)	F.A.		
Precalentamiento	F.A.		

6. DESPUÉS DE LA SOLDADURA

OBSERVACIONES

Apariencia final de la soldadura	A	S	
Tamaño final de la soldadura	A	S	
Longitud de la soldadura	A	S	
Cantidad de distorsión (en la pieza)	A	S	
Tratamiento Térmico después de la soldadura	N.A.		

7. ELEMENTOS INSPECCIONADOS

Inspección a las uniones soldadas correspondientes a la estructura metálica de Puente Metro - Madera.

Abreviaciones:

A: Aplica **N.A.: No aplica** **S: Satisfactorio** **N.S.: No Satisfactorio** **F.A.: Fuera de Alcance**

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.

Concreacero

INFORME INSPECCIÓN VISUAL AWS D1.1 2020

Cliente: Concreacero

Proyecto: Puente Metro - Madera

Subproyecto: Estructura Metalica - Conjunto C1 - Fase 4

Contratista: N.A.


Elaboró: Ing. Jorge Uribe.

Rep N°: T3135I0014


Fecha: 22-oct-24

Lugar: Copacabana

8. ESQUEMA ESTRUCTURA INSPECCIONADA



Vista inferior

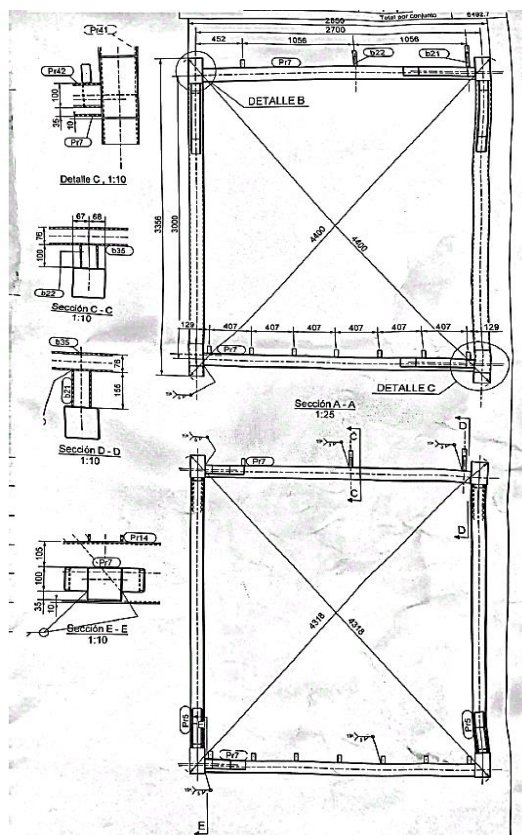

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.

Concreacero

INFORME INSPECCIÓN VISUAL

AWS D1.1 2020

Cliente:	Concreacero	Rep N°:	T3135I0014
Proyecto:	Puente Metro - Madera	Fecha:	22-oct-24
Subproyecto:	Estructura Metalica - Conjunto C1 - Fase 4	Lugar:	Copacabana
Contratista:	N.A.		
Elaboró:	Ing. Jorge Uribe.		

9. DETALLE ELEMENTOS INSPECCIONADOS

ITEM	ELEMENTO	INDICACIÓN	CAL	OBSERVACIONES
1	Uniones sodadas plataforma inferior J1	----	C	Las uniones soldadas se observan conformes y libres de indicaciones superficiales. Algunas no conformidades fueron reparadas y liberadas satisfactoriamente durante la inspección.
2	Uniones sodadas plataforma inferior J2	----	C	
3	Uniones sodadas plataforma inferior J3	----	C	
4	Uniones sodadas plataforma inferior J4	----	C	
5	Uniones sodadas plataforma inferior J5	----	C(R.)	
6	Uniones sodadas plataforma inferior J6	----	C	
7	Uniones sodadas plataforma inferior J7	----	C	
8	Uniones sodadas plataforma inferior J8	----	C	
9	Uniones sodadas plataforma inferior J9	----	C	
10	Uniones sodadas plataforma inferior J10	----	C	
11	Uniones sodadas plataforma inferior J11	----	C	
12	Uniones sodadas plataforma inferior J12	----	C	
13	Uniones sodadas plataforma inferior J13	----	C	

Convención de DISCONTINUIDAD:

Cir: Cordón Irregular	FF: Falta de Fusión	P: Porosidad
EC: Exceso de Concavidad	FP: Falta de Penetración	SE: Socavado Externo
ER: Exceso de Refuerzo	G: Grieta	SI: Socavado Interno
EP: Exceso de Penetración	FMA: Falta de Material de aporte	DMB: Daño Material Base
Calificación (CAL) C: Conforme C(xR): Conforme luego x Reparación NC: No Conforme RI: Re Inspeccionar		

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.

Concreacero

INFORME INSPECCIÓN VISUAL

AWS D1.1 2020

Cliente:	Concreacero	Rep N°:	T3135I0014
Proyecto:	Puente Metro - Madera	Fecha:	22-oct-24
Subproyecto:	Estructura Metalica - Conjunto C1 - Fase 4	Lugar:	Copacabana
Contratista:	N.A.		
Elaboró:	Ing. Jorge Uribe.		

9. DETALLE ELEMENTOS INSPECCIONADOS (Continuación)

ITEM	ELEMENTO	INDICACIÓN	CAL	OBSERVACIONES
14	Uniones sodadas plataforma inferior J14	----	C	Las uniones soldadas se obsevan conformes y libres de indicaciones superficiales. Algunas no conformidades fueron reparadas y liberadas satisfactoriamente durante la inspección.
15	Uniones sodadas plataforma inferior J15	----	C	
16	Uniones sodadas plataforma inferior J16	----	C	
17	Uniones sodadas plataforma inferior J17	----	C	
18	Uniones sodadas plataforma inferior J18	----	C	

10. OBSERVACIONES

- La inspección se llevó a cabo siguiendo los criterios de aceptación y rechazo del código AWS D1.1 de 2020.
- Al momento de la inspección faltaba por aplicar los cordones de soldadura sobrecabeza de la plataforma.

Convención de DISCONTINUIDAD:

Cir: Cordón Irregular	FF: Falta de Fusión	P: Porosidad
EC: Exceso de Concavidad	FP: Falta de Penetración	SE: Socavado Externo
ER: Exceso de Refuerzo	G: Grieta	SI: Socavado Interno
EP: Exceso de Penetración	FMA: Falta de Material de aporte	DMB: Daño Material Base
Calificación (CAL) C: Conforme C(xR): Conforme luego x Reparación NC: No Conforme RI: Re Inspeccionar		

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.	Concreacero
--	--------------------

INFORME INSPECCIÓN VISUAL

AWS D1.1 2020

Cliente:	Concreacero	Rep N°:	T3135I0014
Proyecto:	Puente Metro - Madera	Fecha:	22-oct-24
Subproyecto:	Estructura Metalica - Conjunto C1 - Fase 4	Lugar:	Copacabana
Contratista:	N.A.		
Elaboró:	Ing. Jorge Uribe.		

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro Fotográfico N° 1: Conjunto inspeccionado. C1 Fase 4.



Registro Fotográfico N° 2: Uniones soldadas conformes.



Registro Fotográfico N° 3: Uniones soldadas conformes.



Registro Fotográfico N° 4: Uniones soldadas conformes.



Registro Fotográfico N° 5: Uniones soldadas conformes.



Registro Fotográfico N° 6: Uniones soldadas conformes.

Elaboró:	 Ing. Jorge Uribe.	Revisó:	 Ing. Juan Esteban Velásquez S.	Concreacero
-----------------	--	----------------	--	--------------------

Joint and Welding Ingenieros S.A.S.
